

**46ª Reunião Ordinária do COGE**  
**Monitoramento dos Projetos Prioritários**  
**Ciclo 2025-2026**  
**Maio/2025**



# PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)



## Em andamento

- Prodocs
- Prolegis
- Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
- LGPD
- Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
- E-alece
- Ceará de Valores
- Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos
- Sistema da Ouvidoria

## A iniciar

- Gestão por Competências
- Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
- Laboratório de inovação
- Programa de integridade da gestão
- Elaboração do Código de Ética do Servidor
- Revisão do Código de Ética Parlamentar
- Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (Edil)
- Parlamento Jovem

## Sobrestado

- IACM (Fase II)

## Concluído

- Governança de TIC
- DOALECE
- Alcance + saúde



# PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos Concluídos




Projetos



Priorização de Projetos

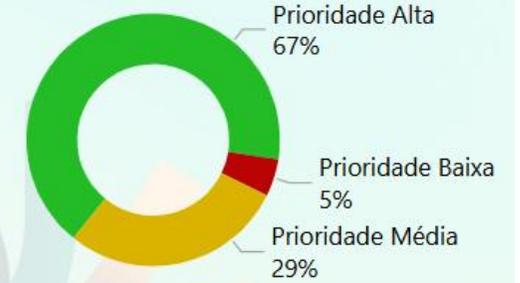

Situação dos Projetos Por Entrega

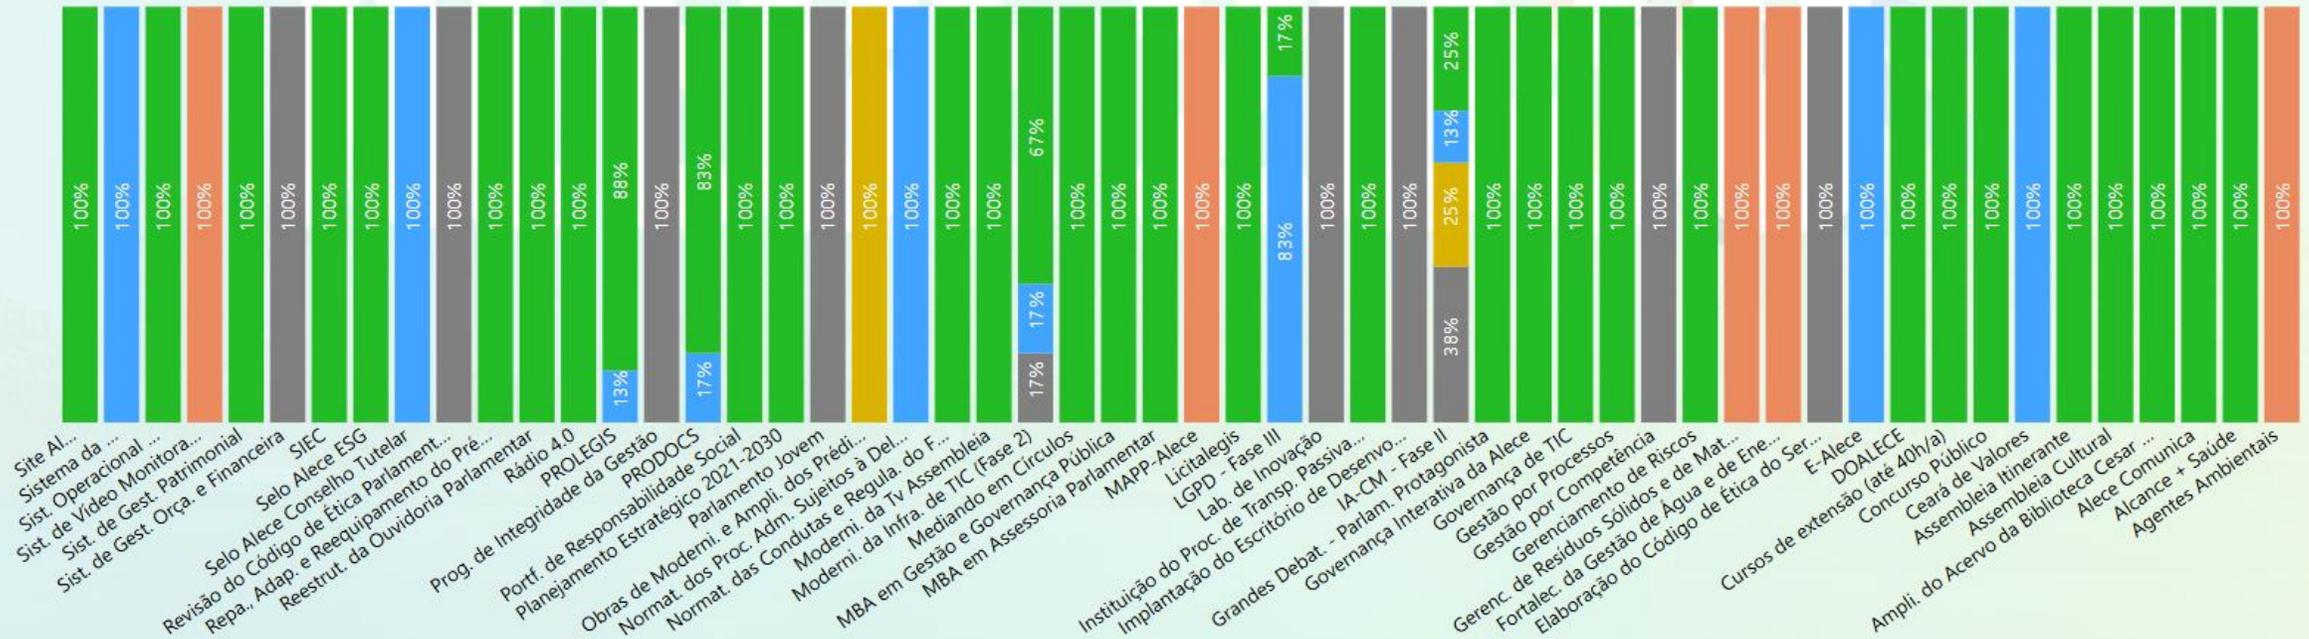

# COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE

<b>Projeto:</b> Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ O processo de aquisição de Solução em Nuvem foi encaminhado ao Nuplaq para ajustes, em seguida será encaminhado à DG para autorização e iniciado o processo licitatório;</li><li>➤ <b>Implantação de Sistema de Segurança e Acesso:</b> Previsto para dia 10/06 o Pregão Eletrônico – Edital nº 37/2025 que visa aquisição de solução integrada de sensorização avançada para rastreamento em tempo real de pessoas e veículos.</li></ul>					
<b>Projeto:</b> Governança de TIC	<b>Status</b>	Concluído	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Com a publicação do PDTIC no site da Alece na página da COTI, conclui-se a implantação do Modelo de Governança de TI na Alece.</li></ul>					
<b>Projeto:</b> DOALECE	<b>Status</b>	Concluído	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Diário Oficial da Alece lançado em 22/05.</li></ul>					
<b>Projeto:</b> Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Média	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Resta aprovação do Ato Normativo pela MD para publicação; e capacitação dos servidores. Luciana (Secretária Executiva da Mesa Diretora) entregou a minuta do Ato ao Presidente para análise.</li></ul>					

09/06/2025



# COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE

<b>Projeto:</b> Adequação dos Processos da Alece à LGPD (Fase 2)	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Instituída a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Alece (Portaria nº 800/2024).</li><li>➤ Resta publicar os seguintes documentos afetos ao projeto:<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Norma de Uso da Rede Wifi</li><li>❖ Norma de Proteção contra Malwares</li><li>❖ Norma de Instalação de Software</li><li>❖ Norma de Controle de <i>Backup</i> e Restauração</li><li>❖ Norma de Controle de Acesso aos Ativos de TI</li><li>❖ Política de Segurança da Informação (está na Procuradoria)</li><li>❖ Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).</li></ul></li></ul>					
<b>Projeto:</b> IA-CM - Fase 2	<b>Status</b>	Sobrestado	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Em razão da diminuição da capacidade operacional (menos 5 servidores) ocorrida a partir de janeiro de 2025, bem como da priorização do Plano de Melhorias construído a partir do Questionário de Autoavaliação do IESGO (TCU) com o objetivo de alcançar o nível "Aprimorado" em 2026, o Projeto Estratégico do Modelo de Capacidade em Auditoria Interna (IA-CM) necessitou ser sobrestado.</li></ul>					

09/06/2025



# COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO

<b>Projeto:</b> PRODOCS	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Aguardando definição da alta direção para aplicação da ferramenta para todos os processos administrativos da Casa;</li><li>➤ A homologação definitiva do sistema está condicionada à análise da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI);</li></ul>					
<b>Projeto:</b> Prolegis	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Fabricainfo encaminhou para a COTI no dia 30 de maio, a documentação para validação da migração e importação;</li><li>➤ Previsto para agosto o treinamento dos usuários na ferramenta.</li></ul>					
<b>Projeto:</b> E-Alece	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Média	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Elaborado pela Diretoria Legislativa o desenho dos requisitos e das seções do sistema;</li><li>➤ Previsto para dia 19/06 apresentação do protótipo inicial da ferramenta pela COTI;</li><li>➤ Em fase de elaboração a identidade visual do canal.</li></ul>					

09/06/2025



# COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO

<b>Projeto:</b> Parlamento Jovem	<b>Status</b>	A iniciar	<b>Priorização</b>	Média	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Termo de Abertura do Projeto em elaboração (objetivos, premissas, stakeholders, cronograma preliminar e demais diretrizes necessárias para o adequado gerenciamento e condução das atividades).</li></ul>					
<b>Projeto:</b> Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (Edil)	<b>Status</b>	A iniciar	<b>Priorização</b>	Média	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Termo de Abertura do Projeto em elaboração (objetivos, premissas, stakeholders, cronograma preliminar e demais diretrizes necessárias para o adequado gerenciamento e condução das atividades).</li></ul>					

# COMITÊ TÉCNICO SETORIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

<b>Projeto:</b> Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	<b>Status</b>	A iniciar	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Formado grupo de trabalho para dar andamento a execução do Projeto;</li><li>➤ O fluxo da despesa está sendo elaborado pela equipe do DFOC e, após sua elaboração, a COTI iniciará o desenvolvimento da ferramenta..</li></ul>					
<b>Projeto:</b> Gestão por Competências	<b>Status</b>	A iniciar	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Realizadas reuniões com DGP para alinhamento quanto às pesquisas de propostas de contratação de consultoria.</li><li>➤ Dia 10/06 haverá reunião com alguns gestores para apresentação da proposta orçamentária do projeto.</li></ul>					

09/06/2025



# COMITÊ TÉCNICO SETORIAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA

<b>Projeto:</b> Sistema da Ouvidoria	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Média	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Layout do sistema desenvolvido pela Comunicação Social e aprovado pela Ouvidoria.</li><li>➤ Conclusão do desenvolvimento e execução dos testes previstos para o mês de junho.</li></ul>					

09/06/2025



# NOVOS PROJETOS

<b>Projeto:</b> Ceará de Valores	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Aprovado em Plenário no dia 08/05 o <b>Projeto de Lei n.º 353/2025</b>;</li><li>➤ Em elaboração: minuta do Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa Comparativo de Preços.</li></ul>					
<b>Projeto:</b> Alcance + Saúde	<b>Status</b>	Concluído	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lançado em 10/05.</li></ul>					
<b>Projeto:</b> Selo Alece Conselho Tutelar: Garantindo Direitos	<b>Status</b>	Em andamento	<b>Priorização</b>	Alta	<b>Ano:</b> 2025
<b>Avanços:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lançamento do “Selo Alece Conselho Tutelar Garantindo Direitos” em 22/5;</li><li>➤ Edital nº 01/2025 publicado em 30/05;</li><li>➤ De 02 a 13/06 - adesão dos Conselhos Tutelares ao Selo;</li><li>➤ De 16 a 27/06 – período de inscrições;</li><li>➤ 30/06 - aula inaugural;</li><li>➤ De de 07/07 a 08/08 - formação online (aulas ao vivo e aulas gravadas);</li><li>➤ De 18/08 a 19/09 – Aplicação das atividades com jogos pedagógicos nas escolas</li></ul>					

09/06/2025



## PRINCIPAIS ENTREGAS (Avanços)

- 26/05 - Realizado fórum “Governança e Responsabilidade Socioambiental nas Instituições Públicas”, com a participação de 60 Servidores e Gestores da Casa;
- **CODINS** - Em elaboração o instrumento de avaliação do resultado anual da Pesquisa de Satisfação e dos Indicadores Estratégicos.
- **UNIPACE** - Informatização das pesquisas de Reação e Eficácia de Treinamento e implantação de automação do envio das pesquisas;
- **DAF / DA** - Apresentada na 45ª Reunião do COGE o Plano de Contratações (PCA) de 2026;

## Pontos de Atenção (Desafios)

- Órgãos sem preenchimento do Plano de Melhorias.
